


福島第一原子力発電所 1～4号機事故の収束に向けた対応状況の概要（9月29日～10月6日。①～⑤の項目の詳細は別紙表を参照）

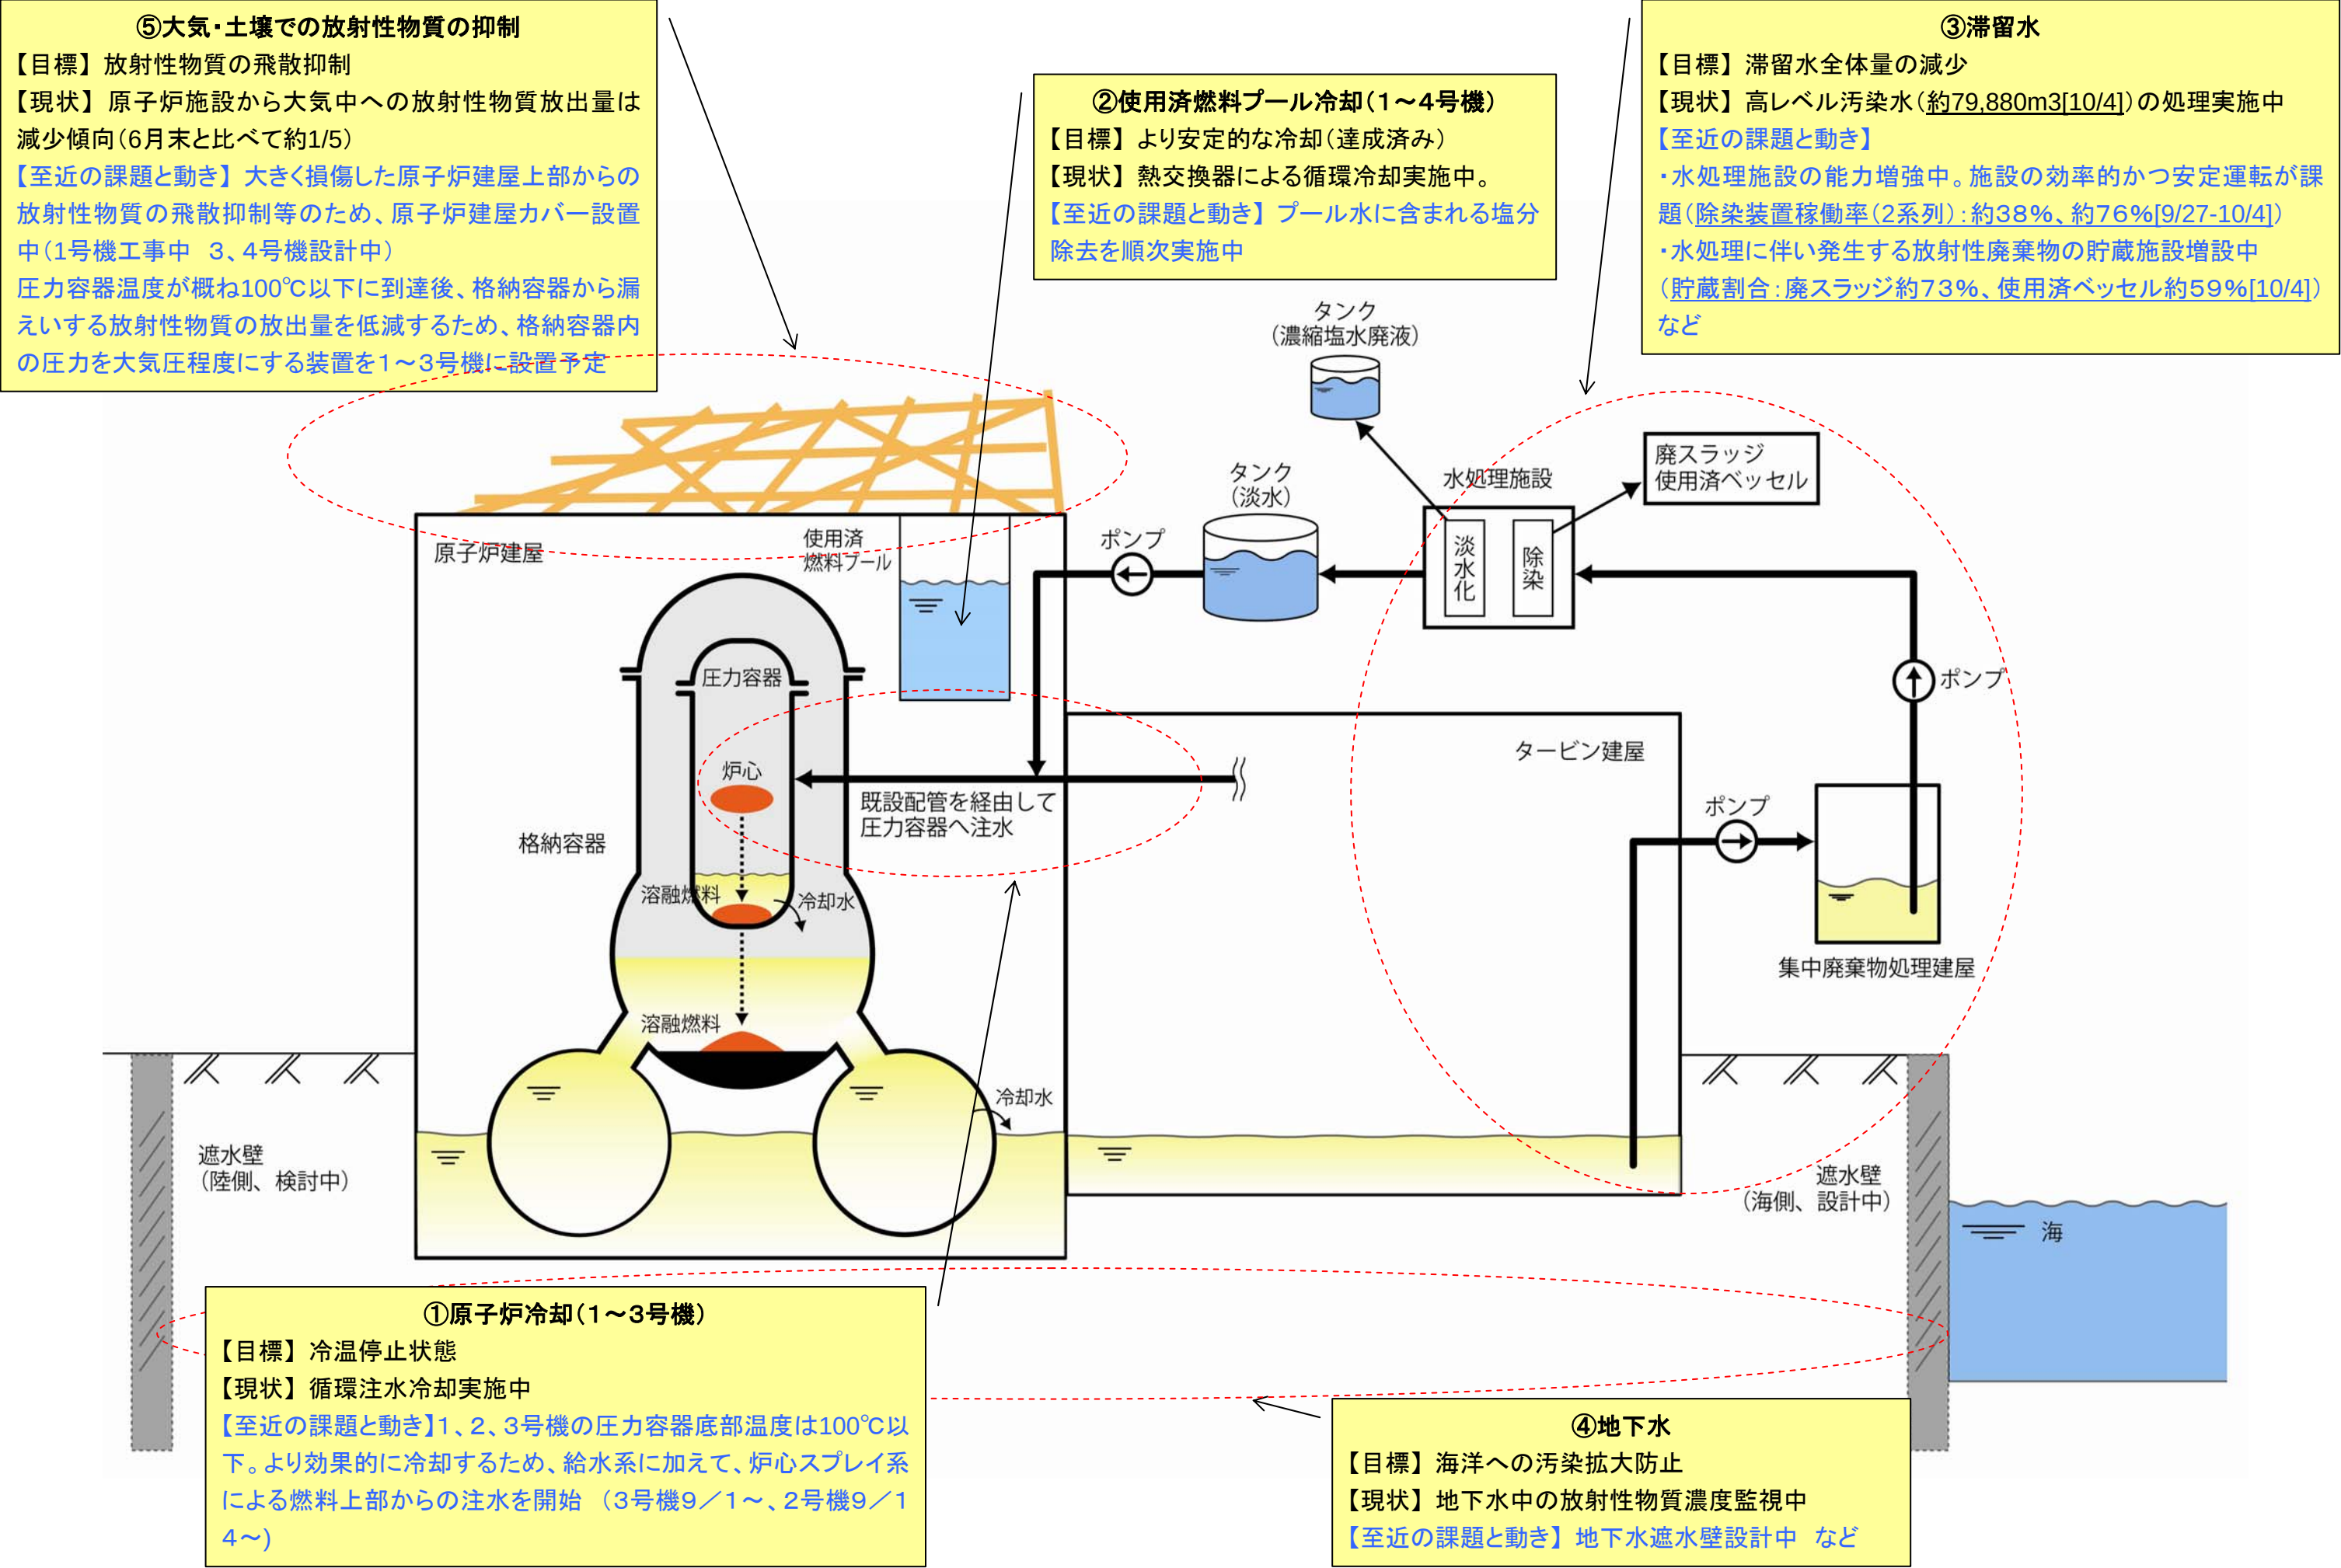

基本情報		1号機	2号機	3号機	4号機	備考	
被災時の状況	炉型	BWR-3	BWR-4	BWR-4	BWR-4		
	電気出力／熱出力(MW)	460/1380	784/2381	784/2381	784/2381		
	運転状態	運転中⇒自動停止	運転中⇒自動停止	運転中⇒自動停止	定検中		
	原子炉装荷燃料体数	400	548	548	0		
	使用済燃料プール内使用済燃料貯蔵数	292	587	514	1331		
	外部電源	地震により喪失					
非常用電源	外部電源喪失とともに非常用ディーゼル発電機が自動起動したが、津波により停止し、全交流電源が喪失						
①原子炉冷却	現状	炉心燃料健全性	炉心損傷(溶融*1)	炉心損傷(溶融*1)	炉心損傷(溶融*1)	燃料なし	
		原子炉圧力容器構造健全性	限定的な損傷・漏えい	不明	不明	健全	
		原子炉格納容器構造健全性	損傷・漏洩の疑いあり	損傷・漏洩の疑いあり	損傷・漏洩の疑いあり	健全	
		炉心冷却機能	代替冷却機能により冷却中			必要とせず	
②使用済燃料プール冷却	STEP2(7月～2012年1月)目標	冷温停止状態:①圧力容器底部温度が概ね100℃以下 ②格納容器からの放射性物質の放出を管理し、追加的放出による公衆被ばく線量を大幅に抑制				—	
	循環注水冷却	システム運転中 [6/27～一部、7/2～全量]				—	
	窒素充填(水素爆発防止)	実施中[4/6～]	実施中[6/28～]	実施中[7/14～]	—		
	課題	循環注水冷却の継続・強化				1、2、3号機の圧力容器底部温度は100℃以下。 3号機[9/1-]及び2号機[9/14-]について、給水系に加え、炉心スプレイ系による燃料上部からの注水を開始。注水流量の調整をしながら圧力容器温度への効果を確認中。	—
③滞留水	現状	使用済燃料の健全性	不明	大部分が健全と推定*2	不明	大部分が健全と推定*2	
		使用済燃料プールの冷却機能	機能回復	機能回復	機能回復	機能回復	
	STEP2(7月～2012年1月)目標	より安定的な冷却:循環冷却システムの確立(2、3号機済み)					
	対策	熱交換器による循環冷却	運転開始[8/10-]	運転中[5/31-]	運転中[6/30-]	運転中[7/31-]	
④地下水	プール水に含まれる塩分の除去	—(海水注水実施せず)		4号機の終了後、順次実施予定		塩分除去装置の運転開始[8/20-]	
	現状	放射性汚染水の滞留、増加				各号機の原子炉、タービン、廃棄物処理建屋、トレンチ内に、高濃度の放射性物質を含む汚染水が大量に滞留 (約79,880m3[10/4])	
	STEP2(7月～2012年1月)目標	滞留水全体量の減少					
	対策	処理施設の設置	・高レベル汚染水放射能処理装置。6月17日処理開始。試運転を経て、本格運転実施中。(定格:1,200m3/日)。 ・放射能処理した水を淡水化处理(6月中旬以降:480m3/日。その後、順次増量予定。)し、原子炉注水に再利用開始[6/27～]。				
⑤大気・土壌抑での放射性物質の	建屋内滞留水の排除、処理継続、強化	・2号機および3号機の高レベル放射性汚染水を集中廃棄物処理建屋に移送実施中(2号:4/19～、3号:5/17～) ・第2セシウム吸着施設運転開始(8/18-)、第1セシウム吸着施設と併せて、並行運転中。 ・淡水化施設増強工事中(10月中旬までに8台設置予定。うち2台を運用開始[8/7-]、さらに3台を本格運用開始[8/31-])					
	廃スラッジ等の保管／管理	高レベル汚染水の処理に伴い発生する高放射能の廃スラッジは適切に保管中。貯蔵施設の準備工事中					
	保管場所の確保	・集中廃棄物処理建屋を高レベル汚染水移送先として利用することで、保管容量14,800m3(10,000m3+4,800m3)確保。 ・高レベル水受タンク用設置工事中(2,800m3設置[9/17]) ・処理水(中低レベル放射性汚染水)受用タンク設置中 累計76,000m3[～9/16]、今後20,000m3程度/月を設置予定]					
	海洋汚染拡大防止など	・取水槽にシルトフェンス設置済み[4/14]。・循環型海水浄化装置本格稼働開始[6/13] ・タービントレンチ立坑閉鎖完了[6/2]。ビット閉塞作業完了[6/10]。 など					
⑥津波・補強ほか	課題	高レベル汚染水の溢水防止				・滞留水の環境への漏洩を回避する観点から、高レベル汚染水放射能処理装置の効率的かつ安定運転が重要。滞留水の水位は当面の目標レベル(OP.3,000)に到達し[9/11]、豪雨や処理施設の長期停止にも耐えられるレベルまで減少。当面、このレベルを維持するよう移送を計画。	
	STEP2(7月～2012年1月)目標	滞留水全体量の減少					
	対策	保管容量拡充・汚染水除染				・低レベル汚染水保管のため、タンク(2,200+6,200+10,000=18,400トン)を確保。メガフロート(1万吨)へ移送実施中[6/30-]。 ・ゼオライトによる除染継続中(5/1～)	
	現状	地下水中の放射性物質				各号機、施設のサブドレン(施設内で集水、管理された地下水)、構内深井戸から放射性物質(ヨウ素131、セシウム134、137、ストロンチウム89、90)を検出(4/7～)。	
⑦プラントパラメータ等	STEP2(7月～2012年1月)目標	海洋への汚染拡大の防止(ステップ1から継続)					
	対策	地下水の汚染拡大の防止策				サブドレンポンプを順次復旧、保管／処理施設拡充計画にあわせてサブドレン管理実施中。地下水遮へい壁設計中。	
	現状	施設外への放射性物質の放散				・原子炉建屋水素爆発(1、3号機)等により、放射性物質及び放射性物質に汚染された瓦礫等が飛散。 ・9月上旬現在における、1～3号機からの放射性物質の放出量は、最大でも約2億Bq/h※(Cs-134,137)と評価[9/20東電発表]。この放出量が1年間続くと仮定した場合の敷地境界の被ばく線量は最大0.4mSvと評価(既放出の放射性物質の影響を除く) ※事故時最大値[3/15]の約400万分の1*、3/25-26の約12500分の1、4/4-6の約1450分の1、6月下旬の約5分の1	
	原子炉建屋健全性	大きく損傷	一部開放	大きく損傷	大きく損傷	発電所敷地内サーベイマップ: http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/index3-j.html * 原子力安全委員会[8/22]における事故時の最大放出量の再評価値が減少したため、前回より減少	
⑧原子炉	STEP2(7月～2012年1月)目標	放射性物質の飛散抑制(ステップ1から継続)					
	飛散防止剤の散布	建屋周辺への本格散布[4/26～6/28]。原子炉及びタービン建屋本体への本格散布[5/27～6/18]。					
	瓦礫の撤去	遠隔操作重機を用いた瓦礫撤去を実施中[4/10～]					
	原子炉建屋カバーの設置	準備工事開始[5/13～] 本体工事開始[6/28～]	—	設計中 準備工事開始[6/20～]	設計中 準備工事開始[6/24～]	3、4号機のカバー設置は、ステップ2終了以降の予定	
⑨格納容器	格納容器ガス管理システムの設置	準備作業中	詳細設計中	詳細設計中	—	圧力容器底部温度が概ね100℃以下に到達後設置予定	
	STEP2(7月～2012年1月)目標	災害の拡大防止(ステップ1から継続)					
	津波対策	・高台に非常用仮設電源移動[4/15]、注水ラインの多重化[～4/15]、高台に消防車等設置[～4/18] ・仮設防潮堤が完成[6/30]					
	各号機補強工事の検討／実施	耐震安全性評価、確認済み[5/28]	耐震安全性評価、確認済み[8/26]	耐震安全性評価、確認済み[7/13]	耐震安全性評価、確認済み[5/28] ・プール底部の支持構造物設置工完了(鋼性支柱設置[6/7-20]、コンクリート打設及びグラウト充填[6/21-7/30])		
⑩原子炉	原子炉注水流量(m3/h) [10/6 11:00]	3.8	3.6(給水系) 7.1(炉心スプレイ系)	2.3(給水系) 8.1(炉心スプレイ系)	—		
	原子炉水位(mm) [10/6 11:00]	A:ダウンスケール、B:-1700 ほぼ一定、B系状況推移を継続確認中	A:-1800、B:-2200 ほぼ一定、状況推移を継続確認中	A:-2400、B:-2300 状況推移を継続確認中	7.93	■"A"、"B"は、多重化された計器の系統を表す。	
	原子炉圧力(MPa) [10/6 11:00]	A:0.013、B:- ほぼ一定、仮設計器測定開始[6/4]	A:0.008、B:- ほぼ一定	A:-0.176、B:-0.123 ほぼ一定、状況推移を継続確認中	—	■原子炉水位は1号機A系のみ計器点検完了済み[5/11]、2号機A系計器点検[6/22-24]	
	原子炉圧力容器温度(給水ノズル温度)(℃) [10/6 11:00]	73.5 降下傾向	81.9 降下中	72.6 降下中	—	■トレンドは、日本原子力技術協会HPを参照: http://www.gengikyo.jp/report/pdf/1Fparameter.pdf	
	原子炉圧力容器温度(圧力容器下部温度)(℃) [10/6 11:00]	75.4 降下傾向	90.1 降下中	75.2 降下中	—		
	格納容器ドライウェル圧力(MPa) [10/6 11:00]	0.1209 ほぼ一定	0.112 ほぼ一定	0.1015 ほぼ一定	—		
	格納容器内圧力抑制室圧力(MPa) [10/6 11:00]	0.100 ほぼ一定	ダウンスケール計器不良	0.1873 ほぼ一定	—		
	プール	使用済燃料プール水温 [10/6 11:00]	23.0℃	26.0℃	24.4℃	33℃	
	⑪高レベル滞留水	貯蔵量[10/4]	16,180m3	19,800m3	25,500m3	18,400m3	
		タービン建屋内水位[10/4]	OP.+4,945mm	OP.+2,763mm	OP.+3,045mm	OP.+3,048mm	OP.:小名浜湾平均潮位 当面の目標:OP.3,000*3
合計水量[10/4]		約79,880m3(集中廃棄物処理建屋の滞留水約17,930m3を含めると約97,810m3)					
累積処理量[～10/4]		除染処理済み:約114,800m3 (うち淡水化处理済み:約46,842m3*)					
⑫環境影響	廃棄物発生量[～10/4]	廃スラッジ:581m3(保管容量800m3)、使用済みベッセル:232本(保管容量393本)、濃縮廃液:2,768m3*(10,000m3)					
	発電所付近の環境影響	●空間線量率:敷地境界にて5～98μSv/h(モニタリングポスト) 事務本館南:298μSv/h 正門:29μSv/h 西門:11μSv/h [10/7 09:00] ●これまでに発電所敷地内の土壌から、微量のプルトニウム[3/28発表]、アメリシウム、キュリウム[4/27発表]、ストロンチウム[4/18採取、5/8発表]を検出。 ●福島第一原子力発電所周辺の地下水及び海水から放射性物質が検出されており、監視強化中[4/16～]。				空間線量率: http://www.tepco.co.jp/nu/fukushim a-np/f1/index-j.html 空気、海水、地下水、土壌ほか: http://www.tepco.co.jp/nu/fukushim a-np/f1/index2-j.html	
⑬作業員の被ばく状況 要員の育成・配置状況		●東電は、3月から作業に従事した3742名、4月から従事した3614名、5月から従事した3040名、6月から従事した2152名、7月から従事した2122名及び8月から従事した1142名について被ばく線量評価中。9月30日、3737名(3月から従事)、3594名(4月から従事)、3026名(5月から従事)、2081名(6月から従事)及び2069名(7月から従事)についての外部被ばく線量及び内部被ばく線量を発表。100mSvを超える者は99名(100～150mSv:77名、150～200mSv:14名、200～250mSv:2名、250mSv～:6名)。250mSvを超える6名の被ばく線量は、いずれも確定値で309～678mSv。(※原子力緊急事態対応の線量限度を250mSvと規定) ●国と事業者の連携により、放射線関係の要員を育成中。また、協力会社のニーズに応じて、原産協会を通じて作業員を募集する仕組みを導入。					

* 1 東京電力解析結果[5/15,23発表]

* 2 東京電力は、2、4号機使用済燃料プール水中の放射性物質詳細分析の結果、大部分の使用済み燃料を健全と判断[5/31]

* 3 東京電力が、海洋への放出リスク及び地下水への漏えいリスクを低減させる観点から設定。

[情報源]

政府緊急対策本部発表（http://www.kantei.go.jp/saigai/index.html）

原子力安全・保安院発表（http://www.nisa.meti.go.jp）

東京電力発表（http://www.tepco.co.jp/nu/index-j.html）

[重要度]（原産協会の評価）

：低

：高

：深刻（緊急対応要）

[対策の進捗状況]

：対策工事済み

：対策工事中

：対策工事未着手（含検討中、機器製作中）
