


わが国の原子力発電所の運転実績

会社名	発電所名	炉型	認可出力 [万kW]	2017年6月				備考	
				発電電力量 [MW時]	設備利用率 [%]	稼働時間 [時]	時間稼働率 [%]		
原電	東海第二	BWR	110.0	0	0.0	0	0.0	東北地方太平洋沖地震に伴う停止(11/3/11- (第25回定検中 11/5/21-)) *1	
	敦賀2	PWR	116.0	0	0.0	0	0.0		
北海道	泊1	"	57.9	0	0.0	0	0.0	第17回定検中(11/4/22-) 第16回定検中(11/8/26-) 第2回定検中(12/5/5-)	
	"2	"	57.9	0	0.0	0	0.0		
	"3	"	91.2	0	0.0	0	0.0		
東北	女川1	BWR	52.4	0	0.0	0	0.0	東北地方太平洋沖地震に伴う停止(11/3/11- (第20回定検中 11/9/10-)) 第11回定検中(10/11/6-、起動中地震により自動停止) 東北地方太平洋沖地震に伴う停止(11/3/11- (第7回定検中 11/9/10-)) 第4回定検中(11/2/6-)	
	"2	"	82.5	0	0.0	0	0.0		
	"3	"	82.5	0	0.0	0	0.0		
	東通1	"	110.0	0	0.0	0	0.0		
東	福島第二1	"	110.0	0	0.0	0	0.0	東北地方太平洋沖地震に伴う事故停止(11/3/11-) 東北地方太平洋沖地震に伴う事故停止(11/3/11-) 東北地方太平洋沖地震に伴う事故停止(11/3/11-) 東北地方太平洋沖地震に伴う事故停止(11/3/11-) 第16回定検中(11/6/6-) タービン制御系の油漏えいに伴う中間停止(07/7/5-) 新潟県中越沖地震に伴う中間停止(07/7/16- (第10回定検中 07/9/19-)) 新潟県中越沖地震に伴う中間停止(07/7/16- (第10回定検中 08/2/11-)) 第13回定検中(12/1/25-) 第10回定検中(12/3/26-) 第10回定検中(11/8/23-)	
	"2	"	110.0	0	0.0	0	0.0		
	"3	"	110.0	0	0.0	0	0.0		
	"4	"	110.0	0	0.0	0	0.0		
	柏崎刈羽1	"	110.0	0	0.0	0	0.0		
	"2	"	110.0	0	0.0	0	0.0		
	"3	"	110.0	0	0.0	0	0.0		
京	"4	"	110.0	0	0.0	0	0.0	第17回施設定検中・安全性向上対策実施中(10/11/29-) 第13回施設定検中・安全性向上対策実施中(12/1/25-) 第5回施設定検中・安全性向上対策実施中(12/3/22-)	
	"5	A BWR	138.0	0	0.0	0	0.0		
	"6	"	135.6	0	0.0	0	0.0		
	"7	"	135.6	0	0.0	0	0.0		
	浜岡3	BWR	110.0	0	0.0	0	0.0		
	"4	"	113.7	0	0.0	0	0.0		
	"5	A BWR	138.0	0	0.0	0	0.0		
中部	志賀1	BWR	54.0	0	0.0	0	0.0	*2	
北陸	"2	A BWR	120.6	0	0.0	0	0.0		
関	美浜3	PWR	82.6	0	0.0	0	0.0	第3回定検中(11/3/11-) 第25回定検中(11/5/14-) 第27回定検中(11/1/10-) 第27回定検中(11/11/25-) 大津地震仮処分命令に伴う運転停止(16/3/10-17/6/9並入)	
	高浜1	"	82.6	0	0.0	0	0.0		
	"2	"	82.6	0	0.0	0	0.0		
	"3	"	87.0	451,368	72.1	528	73.3		
	"4	"	87.0	657,053	104.9	720	100.0		
	大飯1	"	117.5	0	0.0	0	0.0		*3
	"2	"	117.5	0	0.0	0	0.0		
"3	"	118.0	0	0.0	0	0.0			
中国	島根2	BWR	82.0	0	0.0	0	0.0	第24回定検中(11/12/16-) 第16回定検中(13/9/2-) 第15回定検中(13/9/15-) 第17回定検中(12/1/27-) 第23回定検中(12/1/13-)	
	伊方2	PWR	56.6	0	0.0	0	0.0		
	"3	"	89.0	659,326	102.9	720	100.0		
四国	玄海2	"	55.9	0	0.0	0	0.0	第23回定検中(11/1/29-) 第13回定検中(10/12/11-) 第11回定検中(11/12/25-)	
	"3	"	118.0	0	0.0	0	0.0		
	"4	"	118.0	0	0.0	0	0.0		
	川内1	"	89.0	684,514	106.8	720	100.0		
	"2	"	89.0	668,059	104.3	720	100.0		
合計または平均			4,148.2	3,120,320	10.4	3,408	11.3		
( )は前年度			(4,148.2)	(1,343,712)	(4.5)	(1,440)	(4.8)		
時間稼働率②							10.1		
( )は前年度							(4.3)		

備考：\*1 一次冷却材中の放射能濃度上昇に伴う点検停止(11/5/7- (第18回定検中))  
\*2 原子炉冷却材再循環ポンプ軸封部取替に伴う停止(11/3/1- (第13回定検中))  
\*3 第24回定検中(10/12/10-、調整運転(11/3/13-7/16)、蓄圧タンク圧力の低下に伴う停止(11/7/16-9/20))

※お断り  
圧力プレート設置に伴い、志賀2は135.8万kWから120.6万kWに出力を変更している。各表のデータは、変更後の数値に基づく。

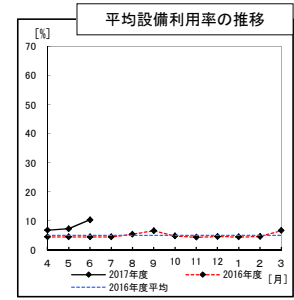

2017年6月			
炉型	基数	出力 [万kW]	設備利用率 [%]
BWR	22	2,316.9	0.0
PWR	20	1,831.3	23.7

2017年6月			
会社名	基数	出力 [万kW]	設備利用率 [%]
日本原子力発電	2	226.0	0.0
北海道	3	207.0	0.0
東北	4	327.4	0.0
東京	11	1261.2	0.0
中部	3	361.7	0.0
北陸	2	174.6	0.0
関西	9	892.8	17.2
中国	1	82.0	0.0
四国	2	145.6	62.9
九州	5	469.9	40.0

$$\text{設備利用率} = \frac{\text{発電電力量}}{\text{認可出力} \times \text{暦時間}} \times 100(\%)$$

$$\text{時間稼働率①} = \frac{\text{発電時間数}}{\text{暦時間}} \times 100(\%)$$

$$\text{時間稼働率②} = \frac{(\text{認可出力} \times \text{稼働時間}) \text{の合計}}{(\text{認可出力} \times \text{暦時間}) \text{の合計}} \times 100(\%)$$
